

LAPORAN BULANAN

NOVEMBER 2024 (NO. 8)



PT. SEMUT IRENG PRATAMA
Pusat Palangkaraya

Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Manugal I
(DAK- Non Tematik)

Nomor Kontrak : 620/728/DPUPR-BM/IV/2024

Tanggal Kontrak : 26 April 2024

Nilai Kontrak : Rp 8.535.873.954,31

Nomor Adendum : 620/1165/DPUPR-BM/VII/2024

Tanggal Adendum : 01 Juli 2024

Nilai Adendum : Rp 8.535.873.954,31

Penyedia Jasa : PT. SEMUT IRENG PRATAMA

Konsultan Pengawas : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN

Tahun Anggaran : 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Katamso / Jalan A.H. Nasution
Telp/Fax. (0536) 4043561, E-mail : dpuprkatingan@gmail.com
KASONGAN 74411 KALIMANTAN TENGAH



LAPORAN BULANAN

PERIODE KE 8 (NOVEMBER)

01 November 2024

s/d


07 November 2024



JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Manupel (DAS. Non Terasil)
- Nomor Kontrak : 8207280/PJR-BM/V/2024
- Tanggal Kontrak : 28 April 2024
- Nilai Kontrak : Rp 6.535.871.954,31
- Nomor Adendum I : 42811650/PJR-BM/V/2024
- Tanggal Adendum I : 01 Juli 2024
- Nilai Adendum I : Rp 6.535.871.954,31
- Nomor Adendum II : 8250600/PJR-BM/V/2024
- Tanggal Adendum II : 22 October 2024
- Nilai Adendum II : Rp 6.535.871.954,31
- Penyedia Jasa : PT. SEMUT BENG PRATAMA
- Konsultan Pengawas : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
- Tahun Anggaran : 2024

Bulan Ke	3
Tanggal	01 November 2024 and 01 November 2024

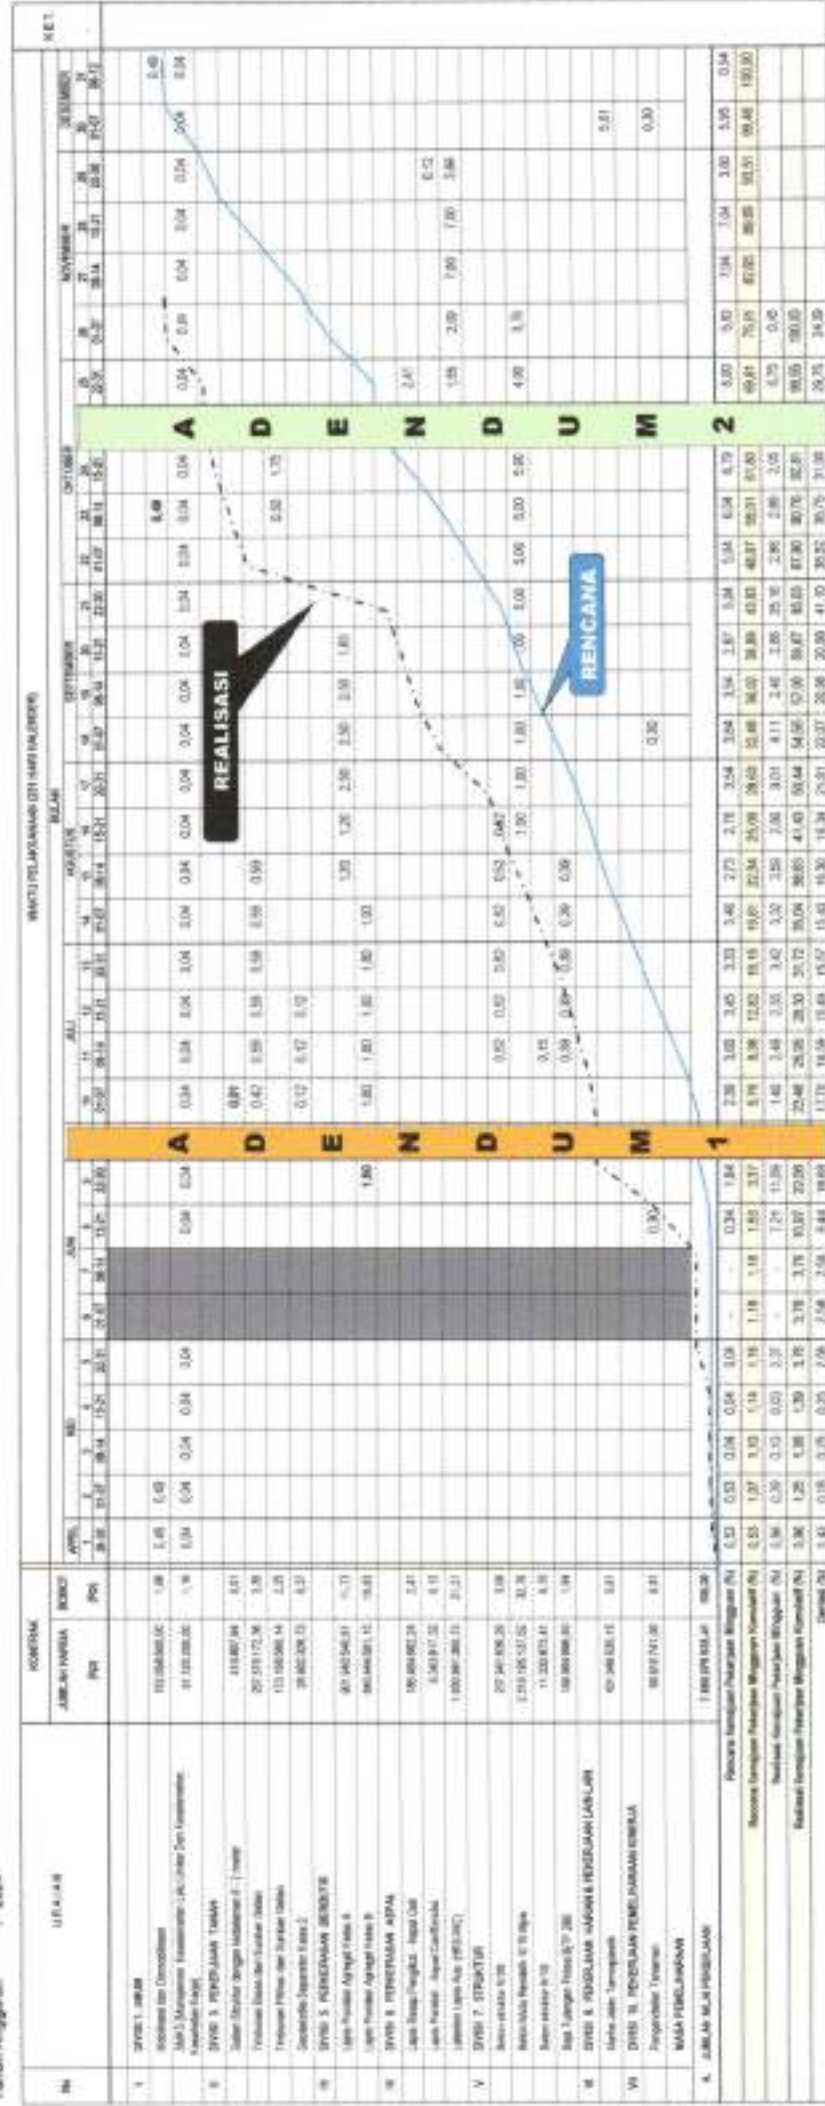

RENCANA
REALISASI
BANK



Desain dan
Konsultasi
CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
Pusat Pengolahan Rupa
Konsultasi
Konsultasi

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

BULAN KE	8
TANGGAL	01 November 2024 s.d. 07 November 2024

Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Menanggal I (DAK Non Tawakel)
 Nomor Kontrak : 42073MCPUR-SMK0204
 Tanggal Kontrak : 28 April 2024
 Nilai Kontrak : Rp. 8.535.873.954,31
 Nomor Adendum I : 42071MCPUR-SMK0204
 Tanggal Adendum I : 01 Juli 2024
 Nilai Adendum I : Rp. 8.535.873.954,31
 Nomor Adendum II : 42020MCPUR-SMK0204
 Tanggal Adendum II : 22 Oktober 2024
 Nilai Adendum II : Rp. 8.535.873.954,31
 Persedia Jasa : PT. SEMUT BERING PRATAMA
 Konsultan Pengawas : CV. TRI KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Tahun Anggaran : 2024

Anggaran		2024		KONTRAK			ADENDUM 1		ADENDUM 2			REALISASI PERK YANG DICAPAI					Keterangan
No	PEKERJAAN	VOL	VOL	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	AKUMULASI BULAN INI	BOBOT (%)	TERTERANG (%)					
DIVISI 1	UMUM																
1.1	MOBILISASI																
A	SEWA TANAH	5.000,00 M2	5.000,00 M2	5.000,00 M2	10.000,00	50.000.000,00	0,05	5.000,00	-	5.000,00	100,00	0,05	Selamat				
B	PERALATAN																
B.1	Asphalt Finisher	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,05	1,00	-	1,00	100,00	0,05	Selamat				
B.2	Compressor 4000 - 6000 L/M	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	750.000,00	750.000,00	0,01	1,00	-	1,00	100,00	0,01	Selamat				
B.3	Concrete Mixer 0,5 - 1,0 M3	2,00 Unit	2,00 Unit	2,00 Unit	750.000,00	1.500.000,00	0,02	2,00	-	2,00	100,00	0,02	Selamat				
B.4	Dump Truck	3,00 Unit	3,00 Unit	3,00 Unit	1.000.000,00	3.000.000,00	0,03	3,00	-	3,00	100,00	0,03	Selamat				
B.5	Excavator 90 - 140 M3	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,05	1,00	-	1,00	100,00	0,05	Selamat				
B.6	Motor Grader 150 Hp	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,05	1,00	-	1,00	100,00	0,05	Selamat				
B.7	Wheel Loader 1,5 - 1,0 M3	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,05	1,00	-	1,00	100,00	0,05	Selamat				
B.8	Tandem Roller 8 - 8 T	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,05	1,00	-	1,00	100,00	0,05	Selamat				
B.9	Tire Roller 8 - 10 T	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,05	1,00	-	1,00	100,00	0,05	Selamat				
B.10	Vibratory Roller 6 - 8 T	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,05	1,00	-	1,00	100,00	0,05	Selamat				
B.11	Concrete Vibrator	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	750.000,00	750.000,00	0,01	1,00	-	1,00	100,00	0,01	Selamat				
B.12	Water Tanker 3000 - 4000 L	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,01	1,00	-	1,00	100,00	0,01	Selamat				
B.13	Asphalt Distributor	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	750.000,00	750.000,00	0,01	1,00	-	1,00	100,00	0,01	Selamat				
C	KAWAN LAFANGAN DAN FASILITAS																
C.1	Papan Rambu Segitiga	2,00 Ls	2,00 Ls	2,00 Ls	500.000,00	1.000.000,00	0,01	2,00	-	2,00	100,00	0,01	Selamat				
D	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM																
D.2	Soil & Aggregate Testing	1,00 Set	1,00 Set	1,00 Set	10.000.000,00	10.000.000,00	0,10	1,00	-	1,00	100,00	0,10	Selamat				
D.3	Blotting Testing	1,00 Set	1,00 Set	1,00 Set	10.000.000,00	10.000.000,00	0,10	1,00	-	1,00	100,00	0,10	Selamat				
D.4	Concrete Testing	1,00 Set	1,00 Set	1,00 Set	10.000.000,00	10.000.000,00	0,10	1,00	-	1,00	100,00	0,10	Selamat				
D.5	Test Load	1,00 Set	1,00 Set	1,00 Set	6.400.000,00	6.400.000,00	0,06	1,00	-	1,00	100,00	0,06	Selamat				
E	MOBILISASI PERSONIL																
E.1	Personil Sewa Struktur Organisasi	1,00 Ls	1,00 Ls	1,00 Ls	3.000.000,00	3.000.000,00	0,04	1,00	-	1,00	100,00	0,04	Selamat				
E.2	Personil Lainnya	1,00 Set	1,00 Set	1,00 Set	5.000.000,00	5.000.000,00	0,07	1,00	-	1,00	100,00	0,07	Selamat				
G	DEMOLISASI																
G.1	SMP3	1,00 Ls	1,00 Ls	1,00 Ls	91.725.200,00	91.725.200,00	1,19	0,00	0,02	0,02	100,00	1,19	Selamat				
						342.781.800,00	5,17						5,17				
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEODINAMIK																
3.1 (4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		90,00 M3	90,00 M3	6.011,71	541.053,12	0,01	90,00	-	90,00	100,00	0,01	Selamat				
3.2 (14)	Timbunan Datar dari Sumber Galian	1.688,37 M3	939,82 M3	939,82 M3	278.417,71	265.526.596,34	3,31	939,82	-	939,82	100,00	3,31	Selamat				
3.2 (26)	Timbunan Pijakan dari Sumber Galian		427,88 M3	427,88 M3	398.340,25	170.364.210,58	2,22	427,88	-	427,88	100,00	2,22	Selamat				
3.5 (26)	Geotekstil Separator Jalan 2		696,00 M2	696,00 M2	48.894,15	33.820.329,73	0,37	696,00	-	696,00	100,00	0,37	Selamat				
						458.812.947,17	5,97						5,97				
DIVISI 5	PEKERJAAN BERSUTUR																
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	862,25 M3	810,38 M3	810,38 M3	1.938.980,31	1.580.108.180,25	11,15	810,38	-	810,38	100,00	11,15	Selamat				
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	862,25 M3	810,38 M3	810,38 M3	1.034.234,23	838.736.104,67	10,91	810,38	-	810,38	100,00	10,91	Selamat				
						1.738.847.993,94	23,81						23,81				
DIVISI 6	PEKERJAAN ASPAL																
6.1 (1)	Lapis Rongga Pengikat - Aspal Celi	8.175,30 Lm	5.445,00 Lm	5.445,00 Lm	33.382,79	183.390.741,55	2,41	5.445,00	-	5.445,00	100,00	2,41	Selamat				
6.1 (24)	Lapis Pondasi - Aspal Cold Emulsi		262,85 Lm	262,85 Lm	36.300,77	10.525.762,24	0,14	262,85	-	262,85	100,00	0,14	Selamat				
6.2 (4)	Lapis Pondasi Aspal (HVS WC)	640,00 Ton	680,30 Ton	672,38 Ton	2.393.702,90	1.600.184.329,68	21,46	672,38	-	672,38	100,00	21,46	Selamat				
						1.640.336.824,67	24,00						24,00				
DIVISI 7	STRUKTUR																
7.1 (74)	Beton struktur 1/30		75,04 M3	75,04 M3	3.171.033,85	237.941.836,20	2,89	75,04	-	75,04	100,00	2,89	Selamat				
7.1 (8)	Beton Malar Rendah 1/15 Mpa	1.217,55 M3	1.183,25 M3	1.183,25 M3	2.088.016,62	2.459.480.962,37	32,65	1.183,25	-	1.183,25	100,00	32,65	Selamat				
7.1 (10)	Beton struktur 1/10		6,35 M3	6,35 M3	1.788.280,51	11.332.812,41	0,13	6,35	-	6,35	100,00	0,13	Selamat				
7.2 (1)	Baja Tulangan Pokok 6/17-280		8.105,73 Kg	8.105,73 Kg	34.413,95	140.954.896,14	1,94	8.105,73	-	8.105,73	100,00	1,94	Selamat				
						2.981.789.418,11	37,73						37,73				
DIVISI 9	PEKERJAAN HAJUAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN																
9.2 (1)	Marka Jalan Tempolok	3.033,50 M2	3.000,40 M2	3.108,85 M2	214.716,77	490.834.098,53	5,80	3.108,85	-	3.108,85	100,00	5,80	Selamat				
						490.834.098,53	5,80						5,80				
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMERIHAPAHAN KIBLAT																
10.1 (22)	Pengertakan Tawakel	55.350,00 M2	55.350,00 M2	55.350,00 M2	1.281,35	69.970.741,00	0,91	44.300,00	11.050,00	55.350,00	100,00	0,91	Selamat				
						69.970.741,00	0,91						0,91				
						JUMLAH	7.480.875.828,41	100,00					100,00 %				
						PAJAK (11%)	823.397.418,90						823.397.418,90 %				
						TOTAL	8.304.273.247,31						8.304.273.247,31 %				
													REALISASI KUMULATIF BULAN INI 100,00 %				
													REALISASI KUMULATIF BULAN LALU 89,53 %				
													REALISASI BULAN INI 0,45 %				
													RENCANA KUMULATIF BULAN INI 85,51 %				
													DEViasi 0,46 %				

Disetujui Oleh :
 Konsultan Pengawas
 CV. TRI KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Pusat Palangka Raya

1. PAULI MARULAN NABAHU, ST
(Site Engineer)
2. JONATHAN KRISTIAN, ST
(Quantity/Quality Engineer)
3. BATU ERTI RYALDI
(Inspector)

Disetujui Oleh :
 Konsultan Pengawas
 CV. TRI KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Pusat Palangka Raya
 ANDRIAN KURNIA, ST, MT
(Direktur)

Disetujui Oleh :
 Persedia Jasa
 PT. SEMUT BERING PRATAMA
 Pusat Palangka Raya

ANDRIAN KURNIA, ST
(Manajer Palangka)

Disetujui Oleh :
 Persedia Jasa
 PT. SEMUT BERING PRATAMA
 Pusat Palangka Raya
 ANDRIAN KURNIA, ST
(Manajer Palangka)

MINGGU KE	26
TANGGAL	01 November 2024 s.d. 07 November 2024

No	PEKERJAAN	KONTRAK	ADEKUM 1		ADEKUM 2			REALISASI PERK. YANG DICAPAI						Keterangan	
		VOL	VOL	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOL			REALISASI				
								MINIQU LALU	MINIQU PI	MI	BOBOT (%)	TEK. TAMBANG (%)			
DW01	UMUM														
1.3	MOBILISASI														
A	SEWA TANAH	5.000,00 M2	5.000,00 M2	5.000,00 M2	10.000,00	50.000.000,00	0,05	5.000,00	-	5.000,00	100,00	0,05	Selamat		
B	PERALATAN														
B.1	Asphalt Finisher	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,06	1,00	-	1,00	100,00	0,06	Selamat		
B.2	Compressor 4000 - 6000 L/M	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	750.000,00	750.000,00	0,01	1,00	-	1,00	100,00	0,01	Selamat		
B.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,5 M3	2,00 Unit	2,00 Unit	2,00 Unit	750.000,00	1.500.000,00	0,02	2,00	-	2,00	100,00	0,02	Selamat		
B.4	Dump Truck	5,00 Unit	5,00 Unit	5,00 Unit	1.000.000,00	5.000.000,00	0,07	5,00	-	5,00	100,00	0,07	Selamat		
B.5	Excavator 90 - 140 M3	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,06	1,00	-	1,00	100,00	0,06	Selamat		
B.6	Motor Grader 100 Hp	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,06	1,00	-	1,00	100,00	0,06	Selamat		
B.7	Wheel Loader 1,5 - 1,6 M3	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,06	1,00	-	1,00	100,00	0,06	Selamat		
B.8	Tandem Roller 5 - 6 T	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,06	1,00	-	1,00	100,00	0,06	Selamat		
B.9	Tire Roller 5 - 10 T	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,06	1,00	-	1,00	100,00	0,06	Selamat		
B.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,06	1,00	-	1,00	100,00	0,06	Selamat		
B.11	Concrete Vibrator	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	750.000,00	750.000,00	0,01	1,00	-	1,00	100,00	0,01	Selamat		
B.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,01	1,00	-	1,00	100,00	0,01	Selamat		
B.13	Asphalt Distributor	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	750.000,00	750.000,00	0,01	1,00	-	1,00	100,00	0,01	Selamat		
C	KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS														
C.1	Papan Nama Lapangan	2,00 Ls	2,00 Ls	2,00 Ls	500.000,00	1.000.000,00	0,01	2,00	-	2,00	100,00	0,01	Selamat		
D	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM														
D.2	Soil & Aggregate Testing	1,00 Set	1,00 Set	1,00 Set	10.000.000,00	10.000.000,00	0,13	1,00	-	1,00	100,00	0,13	Selamat		
D.3	Blottinghouse Testing	1,00 Set	1,00 Set	1,00 Set	10.000.000,00	10.000.000,00	0,13	1,00	-	1,00	100,00	0,13	Selamat		
D.4	Concrete Testing	1,00 Set	1,00 Set	1,00 Set	10.000.000,00	10.000.000,00	0,13	1,00	-	1,00	100,00	0,13	Selamat		
D.5	Test Lur	1,00 Set	1,00 Set	1,00 Set	6.433.400,00	6.433.400,00	0,08	1,00	-	1,00	100,00	0,08	Selamat		
E	MOBILISASI PERSONIL														
E.1	Personil Sewa Lokator Organisasi	1,00 Ls	1,00 Ls	1,00 Ls	3.000.000,00	3.000.000,00	0,04	1,00	-	1,00	100,00	0,04	Selamat		
E.2	Personil Lapangan	1,00 Set	1,00 Set	1,00 Set	5.000.000,00	5.000.000,00	0,07	1,00	-	1,00	100,				

INCORPORATION OF STYRENE, ST

Diketahui :
Ditanyakan :
P.T. SEMANGING PRATAMA
Pusat Pemasangan
Mekanisme Praktek Kerja
Ciri Ciri

LAPORAN HARIAN

01 November 2024



Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Marugal I (DAK- Non Tematik)
 Nomor Kontrak : 620/280/DPUPR-BM/VI/2024
 Tanggal Kontrak : 26 April 2024
 Nilai Kontrak : Rp 8.535.873.954,31
 Nomor Adendum I : 620/165/DPUPR-BM/VI/2024
 Tanggal Adendum I : 01 Juli 2024
 Nilai Adendum I : Rp 8.535.873.954,31
 Nomor Adendum II : 620/2002/DPUPR-BM/X/2024
 Tanggal Adendum II : 22 Oktober 2024
 Nilai Adendum II : Rp 8.535.873.954,31
 Penyedia Jasa : PT. SEMUT IRENG PRATAMA
 Konsultan Pengawas : CV. TIK KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Tahun Anggaran : 2024

A. ITEM PEKERJAAN		
NO	PEKERJAAN	VOL
DIVISI 1	UMUM	
1.2	MOBILISASI	
A	BEWA TANAH	- M2
B	PERALATAN	
B.1	Asphalt Finisher	- Unit
B.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
B.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
B.4	Dump Truck	- Unit
B.5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
B.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
B.7	Wheel Loader 1,5-1,6 M3	- Unit
B.8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
B.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
B.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
B.11	Concrete Vibrator	- Unit
B.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
B.13	Asphalt Distributor	- Unit
C	KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS	
C.1	Papan Nama Kegiatan	- Ls
D	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM	
D.2	Soil & Aggregate Testing	- Set
D.3	Bituminous Testing	- Set
D.4	Concrete Testing	- Set
D.5	Test User	- Set
E	MOBILISASI PERSONIL	
E.1	Personil Sesuai Struktur Organisasi	- Ls
E.2	Personil Lainnya	- Set
G	DEMobilisasi	- Ls
1.8	SMK3	- Ls
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	- M3
3.2.(1a)	Timbunan Basa dari Sumber Galian	- M3
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	- M2
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR	
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL	
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
6.1.(2a)	Lapis Perikat - Aspal Cair Emulsi	- Liter
6.3.(4)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
DIVISI 7	STRUKTUR	
7.1.(7a)	Beton struktur f'c 20	- M3
7.1.(8)	Beton Mutu Rendah f'c 15 Mpa	- M3
7.1.(10)	Beton struktur f'c 10	- M3
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos B/T P 280	- Kg
DIVISI 9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	- M2
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KIMIRJA	
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	1.600,00 M2

B. BAHAN PEKERJAAN		
NO	BAHAN	JUMLAH
B.1	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
B.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
B.3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
B.4	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
B.5	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
B.6	Beton Mutu Rendah f'c 15 Mpa	- M3
B.7	Marka Jalan Termoplastik	- M2
B.8	Pengendalian Tanaman	1.600,00 M2
B.9	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	- M3
B.10	Timbunan Basa dari Sumber Galian	- M3
B.11	Geotekstil Separator Kelas 2	- M2
B.12	Beton struktur f'c 20	- M3
B.13	Beton struktur f'c 10	- M3
B.14	Baja Tulangan Polos B/T P 280	- Kg

C. PENGGUNAAN PERALATAN PEKERJAAN		
NO	PERALATAN UTAMA	JUMLAH
C.1	Asphalt Finisher	- Unit
C.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
C.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
C.4	Dump Truck	- Unit
C.5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
C.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
C.7	Wheel Loader 1,5-1,6 M3	- Unit
C.8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
C.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
C.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
C.11	Concrete Vibrator	- Unit
C.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
C.13	Asphalt Distributor	- Unit

D. PERSONIL KEGIATAN		
NO	PERSONIL	JUMLAH
D.1	Direksi	- Orang
D.2	Konsultan Supervisi	- Orang
D.3	Pelaksana	- Orang
D.4	Mandor	- Orang
D.5	Pekerja	- Orang
D.6	Tukang	- Orang
D.7	Sopir	- Orang
D.8	Operator	- Orang
D.9	Pembantu Operator	- Orang
D.10	Mekaniik	- Orang

E. KONDISI CUACA DI LOKASI PEKERJAAN			
NO	CUACA	PAGI	SORE
E.1	Cerah		
E.2	Mendung		
E.3	Gerimis		
E.4	Hujan		
E.5	Langsor		
E.6	Banir (Genangan Air)		

INSTANSI	CATATAN	TANDA TANGAN/PARAF
KONSULTAN PENGAWAS		
PENYEDIA JASA		

LAPORAN HARIAN

02 November 2024



Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Menanggal I (DAK- Non Tansatik)
 Nomor Kontrak : 620/728/DPUPR-BM/V/2024
 Tanggal Kontrak : 26 April 2024
 Nilai Kontrak : Rp 8.535.873.954,31
 Nomor Adendum I : 626/165/DPUPR-BM/V/2024
 Tanggal Adendum I : 01 Juli 2024
 Nilai Adendum I : Rp 8.535.873.954,31
 Nomor Adendum II : 626/292/DPUPR-BM/V/2024
 Tanggal Adendum II : 22 Oktober 2024
 Nilai Adendum II : Rp 8.535.873.954,31
 Penyedia Jasa : PT. SEMUT (RENG PRATAMA)
 Konsultan Pengawas : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Tahun Anggaran : 2024

A. ITEM PEKERJAAN		
NO	PEKERJAAN	VOL
DIVISI 1 UMUM		
1.2	MOBILISASI	
A	SEWA TANAH	- M2
B	PERALATAN	
B.1	Asphalt Finisher	- Unit
B.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
B.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
B.4	Dump Truck	- Unit
B.5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
B.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
B.7	Wheel Loader 1,3-1,6 M3	- Unit
B.8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
B.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
B.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
B.11	Concrete Vibrator	- Unit
B.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
B.13	Asphalt Distributor	- Unit
C	KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS	
C.1	Papan Nama Kegiatan	- Ls
D	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM	
D.2	Soil & Aggregate Testing	- Set
D.3	Blottinghouse Testing	- Set
D.4	Concrete Testing	- Set
D.5	Test Luar	- Set
E	MOBILISASI PERSONIL	
E.1	Personil Sesuai Struktur Organisasi	- Ls
E.2	Personil Lainnya	- Set
G	DEMOBILISASI	- Ls
1.8	SMK3	- Ls
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		
3.1 (4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	- M3
3.2 (1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	- M3
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
3.5 (2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	- M2
DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
6.1 (2a)	Lapis Perkat - Aspal Cair Emulsi	- Liter
6.3 (4)	Lattexon Lapis Atas (HRS-WC)	- Ton
DIVISI 7 STRUKTUR		
7.1 (7a)	Beton struktur 1c/20	- M3
7.1 (8)	Beton Mutu Rendah 1c/15 Mpa	- M3
7.1 (10)	Beton struktur 1c/10	- M3
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos S/TP 280	- Kg
DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN		
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	- M2
DIVISI 10 PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		
10.1 (22)	Pengendalian Tanaman	1.550,00 M2

B. BAHAN PEKERJAAN		
NO	BAHAN	JUMLAH
B.1	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
B.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
B.3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
B.4	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
B.5	Lattexon Lapis Atas (HRS-WC)	- Ton
B.6	Beton Mutu Rendah 1c/15 Mpa	- M3
B.7	Marka Jalan Termoplastik	- M2
B.8	Pengendalian Tanaman	1.550,00 M2
B.9	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	- M3
B.10	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	- M3
B.11	Geotekstil Separator Kelas 2	- M2
B.12	Beton struktur 1c/20	- M3
B.13	Beton struktur 1c/10	- M3
B.14	Baja Tulangan Polos S/TP 280	- Kg

C. PENGGUNAAN PERALATAN PEKERJAAN		
NO	PERALATAN UTAMA	JUMLAH
C.1	Asphalt Finisher	- Unit
C.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
C.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
C.4	Dump Truck	- Unit
C.5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
C.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
C.7	Wheel Loader 1,3-1,6 M3	- Unit
C.8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
C.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
C.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
C.11	Concrete Vibrator	- Unit
C.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
C.13	Asphalt Distributor	- Unit

D. PERSONIL KEGIATAN		
NO	PERSONIL	JUMLAH
D.1	Direksi	- Orang
D.2	Konsultan Supervisi	- Orang
D.3	Pelaksana	- Orang
D.4	Mandor	- Orang
D.5	Pekerja	- Orang
D.6	Tukang	- Orang
D.7	Sopir	- Orang
D.8	Operator	- Orang
D.9	Pembantu Operator	- Orang
D.10	Mekanik	- Orang

E. KONDISI CUACA DI LOKASI PEKERJAAN				
NO	CUACA	PAGI	SIANG	SORE
E.1	Cerah			
E.2	Merdu			
E.3	Gedimis			
E.4	Hujan			
E.5	Langsai			
E.6	Banjir (Gerangan Air)			

INSTANSI	CATATAN	TANDA TANGKAPARAF
KONSULTAN PENGAWAS		
PENYEDIA JASA		

LAPORAN HARIAN

03 November 2024



Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Manugai I (DAK- Non Tematik)
 Nomor Kontrak : 629/728/DPUPR-BM/VI/2024
 Tanggal Kontrak : 26 April 2024
 Nilai Kontrak : Rp 8.535.873.954,31
 Nomor Adendum I : 620/1165/DPUPR-BM/VI/2024
 Tanggal Adendum I : 01 Juli 2024
 Nilai Adendum I : Rp 8.535.873.954,31
 Nomor Adendum II : 620/2062/DPUPR-BM/X/2024
 Tanggal Adendum II : 22 Oktober 2024
 Nilai Adendum II : Rp 8.535.873.954,31
 Penyedia Jasa : PT. SEMUT IRENG PRATAMA
 Konsultan Pengawas : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Tahun Anggaran : 2024


A. ITEM PEKERJAAN		
NO	PEKERJAAN	VOL
DIVISI 1	UMUM	
1.2	MOBILISASI	
A	SEWA TANAH	- M2
B	PERALATAN	
B.1	Asphalt Finisher	- Unit
B.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
B.3	Concrete Mixer 0.3 - 0.6 M3	- Unit
B.4	Dump Truck	- Unit
B.5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
B.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
B.7	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	- Unit
B.8	Tandem Roller 5 - 8 T	- Unit
B.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
B.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
B.11	Concrete Vibrator	- Unit
B.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
B.13	Asphalt Distributor	- Unit
C	KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS	
C.1	Papan Nama Kegiatan	- Ls
D	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM	
D.2	Soil & Aggregate Testing	- Set
D.3	Bluminoous Testing	- Set
D.4	Concrete Testing	- Set
D.5	Test Luar	- Set
E	MOBILISASI PERSONIL	
E.1	Personil Sesuai Struktur Organisasi	- Ls
E.2	Personil Lainnya	- Set
G	DEMOBILISASI	- Ls
1.6	SMK3	- Ls
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
3.1(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	- M3
3.2(1a)	Timbunan Biosa dari Sumber Galian	- M3
3.2(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
3.5(2b)	Geotekstle Separator Kelas 2	- M2
DIVISI 4	PERKERASAN BERBUTIR	
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
5.1(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL	
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
6.1(2a)	Lapis Perkuat - Aspal Cair/Emulsi	- Liter
6.3(4)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
DIVISI 7	STRUKTUR	
7.1(7a)	Beton struktur f'c20	- M3
7.1(8)	Beton Mutu Rendah f'c15 Mpa	- M3
7.1(10)	Beton struktur f'c10	- M3
7.3(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	- Kg
DIVISI 9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	
9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	- M2
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	
10.1(22)	Pengendalian Tanaman	1.600.00 M2

B. BAHAN PEKERJAAN		
NO	BAHAN	JUMLAH
B.1	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
B.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
B.3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
B.4	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
B.5	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
B.6	Beton Mutu Rendah f'c15 Mpa	- M3
B.7	Marka Jalan Termoplastik	- M2
B.8	Pengendalian Tanaman	1.600.00 M2
B.9	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	- M3
B.10	Timbunan Biosa dari Sumber Galian	- M3
B.11	Geotekstle Separator Kelas 2	- M2
B.12	Beton struktur f'c20	- M3
B.13	Beton struktur f'c10	- M3
B.14	Baja Tulangan Polos BJTP 280	- Kg

C. PENGGUNAAN PERALATAN PEKERJAAN		
NO	PERALATAN UTAMA	JUMLAH
C.1	Asphalt Finisher	- Unit
C.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
C.3	Concrete Mixer 0.3 - 0.6 M3	- Unit
C.4	Dump Truck	- Unit
C.5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
C.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
C.7	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	- Unit
C.8	Tandem Roller 5 - 8 T	- Unit
C.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
C.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
C.11	Concrete Vibrator	- Unit
C.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
C.13	Asphalt Distributor	- Unit

D. PERSONIL KEGIATAN		
NO	PERSONIL	JUMLAH
D.1	Direksi	- Orang
D.2	Konsultan Supervisi	- Orang
D.3	Poliklsana	- Orang
D.4	Mandir	- Orang
D.5	Pekarya	- Orang
D.6	Tukang	- Orang
D.7	Sopir	- Orang
D.8	Operator	- Orang
D.9	Pembantu Operator	- Orang
D.10	Mekanik	- Orang

E. KONDISI CUACA DI LOKASI PEKERJAAN				
NO	CUACA	PAGI	SIANG	SORE
E.1	Cerah			
E.2	Mendung			
E.3	Gerimis			
E.4	Hujan			
E.5	Longsor			
E.6	Banjir (Gatangan Air)			

INSTANSI	CATATAN	TANDA TANGAN/PARAF
KONSULTAN PENGAWAS		
PENYEDIA JASA		

LAPORAN HARIAN

04 November 2024



Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Marugal I (DAK- Non Terasak)
 Nomor Kontrak : 629/128/DPUPR-BM/V/2024
 Tanggal Kontrak : 25 April 2024
 Nilai Kontrak : Rp 8.535.873.954,31
 Nomor Adendum I : 629/1165/DPUPR-BM/V/2024
 Tanggal Adendum I : 01 Juli 2024
 Nilai Adendum I : Rp 8.535.873.954,31
 Nomor Adendum II : 629/2082/DPUPR-BM/X/2024
 Tanggal Adendum II : 22 Oktober 2024
 Nilai Adendum II : Rp 8.535.873.954,31
 Penyedia Jasa : PT. SEMUT IRENG PRATAMA
 Konsultan Pengawas : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Tahun Anggaran : 2024

A. ITEM PEKERJAAN		
NO	PEKERJAAN	VOL
DIVISI 1	UMUM	
1.2	MOBILISASI	
A	SIRWA TANAH	- M2
B	PERALATAN	
B.1	Asphalt Finisher	- Unit
B.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
B.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
B.4	Dump Truck	- Unit
B.5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
B.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
B.7	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	- Unit
B.8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
B.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
B.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
B.11	Concrete Vibrator	- Unit
B.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
B.13	Asphalt Distributor	- Unit
C	KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS	
C.1	Papan Nama Kegiatan	- Ls
D	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM	
D.2	Soil & Aggregate Testing	- Set
D.3	Blumhous Testing	- Set
D.4	Concrete Testing	- Set
D.5	Test Luer	- Set
E	MOBILISASI PERSONIL	
E.1	Personil Sesuai Struktur Organisasi	- Ls
E.2	Personil Lainnya	- Set
G	DEMOBILISASI	- Ls
1.8	SMK3	- Ls
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	- M3
3.2.(1a)	Timbunan Basa dari Sumber Galian	- M3
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	- M2
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR	
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL	
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
6.1.(2a)	Lapis Persekat - Aspal Cair/Emulsi	- Liter
6.3.(4)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
DIVISI 7	STRUKTUR	
7.1.(7a)	Beton struktur Ic'20	- M3
7.1.(8)	Beton Mutu Rendah Ic'15 Mpa	- M3
7.1.(10)	Beton struktur Ic'10	- M3
7.3.(1)	Baja Tulangan Pokok B/TP 280	- Kg
DIVISI 9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	- M2
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	1.500,00 M2

B. BAHAN PEKERJAAN		
NO	BAHAN	JUMLAH
B.1	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
B.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
B.3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
B.4	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
B.5	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
B.6	Beton Mutu Rendah Ic'15 Mpa	- M3
B.7	Marka Jalan Termoplastik	- M2
B.8	Pengendalian Tanaman	1.500,00 M2
B.9	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	- M3
B.10	Timbunan Basa dari Sumber Galian	- M3
B.11	Geotekstil Separator Kelas 2	- M2
B.12	Beton struktur Ic'20	- M3
B.13	Beton struktur Ic'10	- M3
B.14	Baja Tulangan Pokok B/TP 280	- Kg

C. PENGGUNAAN PERALATAN PEKERJAAN		
NO	PERALATAN UTAMA	JUMLAH
C.1	Asphalt Finisher	- Unit
C.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
C.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
C.4	Dump Truck	- Unit
C.5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
C.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
C.7	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	- Unit
C.8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
C.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
C.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
C.11	Concrete Vibrator	- Unit
C.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
C.13	Asphalt Distributor	- Unit

D. PERSONIL KEGIATAN		
NO	PERSONIL	JUMLAH
D.1	Direksi	- Orang
D.2	Konsultan Supervisi	- Orang
D.3	Pelaksana	- Orang
D.4	Mandor	- Orang
D.5	Pekerja	- Orang
D.6	Tukang	- Orang
D.7	Sopir	- Orang
D.8	Operator	- Orang
D.9	Pembantu Operator	- Orang
D.10	Mekanik	- Orang

E. KONDISI CUACA DI LOKASI PEKERJAAN			
NO	CUACA	PAGI	SORE
E.1	Cerah		
E.2	Mendung		
E.3	Gedimla		
E.4	Hujan		
E.5	Longsor		
E.6	Rangy (Gerangan Air)		

INSTANSI	CATATAN	TANDA TANGAN/PARAF
KONSULTAN PENGAWAS		
PENYEDIA JASA		

LAPORAN HARIAN

05 November 2024

Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Manugul I (DAK- Non Tematik)
 Nomor Kontrak : 629/28/DPUPR-BM/VI/2024
 Tanggal Kontrak : 26 April 2024
 Nilai Kontrak : Rp 8.535.873.854,31
 Nomor Adendum I : 629/1165/DPUPR-BM/VI/2024
 Tanggal Adendum I : 01 Juli 2024
 Nilai Adendum I : Rp 8.535.873.854,31
 Nomor Adendum II : 629/2062/DPUPR-BM/VI/2024
 Tanggal Adendum II : 22 Oktober 2024
 Nilai Adendum II : Rp 8.535.873.854,31
 Penyedia Jasa : PT. SEMUT IRENG PRATAMA
 Konsultan Pengawas : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Tahun Anggaran : 2024



A. ITEM PEKERJAAN		
NO	PEKERJAAN	VOL
DIVISI 1	UMUM	
1.2	MOBILISASI	
A	SEWA TANAH	- M2
B	PERALATAN	
B.1	Asphalt Finisher	- Unit
B.2	Compressor 4000 - 5500 L/M	- Unit
B.3	Concrete Mixer 0.3 - 0.6 M3	- Unit
B.4	Dump Truck	- Unit
B.5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
B.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
B.7	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	- Unit
B.8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
B.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
B.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
B.11	Concrete Vibrator	- Unit
B.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
B.13	Asphalt Distributor	- Unit
C	KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS	
C.1	Papan Nama Kegiatan	- Ls
D	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM	
D.2	Soil & Aggregate Testing	- Set
D.3	Blumhouse Testing	- Set
D.4	Concrete Testing	- Set
D.5	Test Luar	- Set
E	MOBILISASI PERSONIL	
E.1	Personil Sewa Struktur Organisasi	- Ls
E.2	Personil Lainnya	- Set
G	DEMOBILISASI	- Ls
1.6	SMK3	- Ls
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
3.1 (A)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	- M3
3.2 (1a)	Timbunan Basa dari Sumber Galian	- M3
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
3.5 (2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	- M2
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR	
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL	
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
6.1 (2a)	Lapis Perseut - Aspal Cair Emulsi	- Liter
6.3 (4)	Lapisan Lapis Aspal (HRS-WC)	- Ton
DIVISI 7	STRUKTUR	
7.1 (7a)	Beton struktur f'c'20	- M3
7.1 (8)	Beton Mutu Rendah f'c'15 Mpa	- M3
7.1 (10)	Beton struktur f'c'10	- M3
7.3 (1)	Baja Tulangan Pokok B/TTP 280	- Kg
DIVISI 9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	- M2
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	
10.1 (22)	Pengendalian Tanaman	1.700.00 M2

B. BAHAN PEKERJAAN		
NO	BAHAN	JUMLAH
B 1	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
B 2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
B 3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
B 4	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
B 5	Lapisan Lapis Aspal (HRS-WC)	- Ton
B 6	Beton Mutu Rendah f'c'15 Mpa	- M3
B 7	Marka Jalan Termoplastik	- M2
B 8	Pengendalian Tanaman	1.700.00 M2
B 9	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	- M3
B 10	Timbunan Basa dari Sumber Galian	- M3
B 11	Geotekstil Separator Kelas 2	- M2
B 12	Beton struktur f'c'20	- M3
B 13	Beton struktur f'c'10	- M3
B 14	Baja Tulangan Pokok B/TTP 280	- Kg

C. PENGGUNAAN PERALATAN PEKERJAAN		
NO	PERALATAN UTAMA	JUMLAH
C 1	Asphalt Finisher	- Unit
C 2	Compressor 4000 - 5500 L/M	- Unit
C 3	Concrete Mixer 0.3 - 0.6 M3	- Unit
C 4	Dump Truck	- Unit
C 5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
C 6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
C 7	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	- Unit
C 8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
C 9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
C 10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
C 11	Concrete Vibrator	- Unit
C 12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
C 13	Asphalt Distributor	- Unit

D. PERSONIL KEGIATAN		
NO	PERSONIL	JUMLAH
D 1	Direksi	- Orang
D 2	Konsultan Supervisi	- Orang
D 3	Pelaksana	- Orang
D 4	Mandor	- Orang
D 5	Pekerja	- Orang
D 6	Tukang	- Orang
D 7	Sopir	- Orang
D 8	Operator	- Orang
D 9	Pembantu Operator	- Orang
D 10	Mekanik	- Orang

E. KONDISI CUACA DI LOKASI PEKERJAAN			
NO	CUACA	PAGI	SORE
E 1	Cerah		
E 2	Mendung		
E 3	Gedim		
E 4	Hujan		
E 5	Langsor		
E 6	Banjir (Genangan Air)		

INSTANSI	CATATAN	TANDA TANGAN/PARAF
KONSULTAN PENGAWAS		
PENYEDIA JASA		

LAPORAN HARIAN

06 November 2024

Pekerjaan : Perancangan Long Segmen Jalan Marugal I (DAK- Non Tematik)
 Nomor Kontrak : 620/728/DPUPR-BMW/2024
 Tanggal Kontrak : 26 April 2024
 Nilai Kontrak : Rp 8.535.873.954,31
 Nomor Adendum I : 620/1165/DPUPR-BMW/2024
 Tanggal Adendum I : 01 Juli 2024
 Nilai Adendum I : Rp 8.535.873.954,31
 Nomor Adendum II : 620/2002/DPUPR-BMW/2024
 Tanggal Adendum II : 22 Oktober 2024
 Nilai Adendum II : Rp 8.535.873.954,31
 Penyedia Jasa : PT. SEMUT IRENG PRATAMA
 Konsultan Pegawai : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Tahun Anggaran : 2024



A. ITEM PEKERJAAN		
NO	PEKERJAAN	VOL
DIVISI 1	UMUM	
1.2	MOBILISASI	
A	SEWA TANAH	- M2
B	PERALATAN	
B.1	Asphalt Finisher	- Unit
B.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
B.3	Concrete Mixer 0.3 - 0.6 M3	- Unit
B.4	Dump Truck	- Unit
B.5	Excavator 60 - 140 M3	- Unit
B.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
B.7	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	- Unit
B.8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
B.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
B.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
B.11	Concrete Vibrator	- Unit
B.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
B.13	Asphalt Distributor	- Unit
C	KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS	
C.1	Papan Nama Kegiatan	- Ls
D	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM	
D.2	Soil & Aggregate Testing	- Set
D.3	Blumhouse Testing	- Set
D.4	Concrete Testing	- Set
D.5	Test Luar	- Set
E	MOBILISASI PERSONIL	
E.1	Personil Sosial Struktur Organisasi	- Ls
E.2	Personil Lainnya	- Set
G	DEMobilisasi	- Ls
1.8	BMK3	- Ls
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	- M3
3.2.(1a)	Timbunan Blase dari Sumber Galian	- M3
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	- M2
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR	
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL	
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
6.1.(2a)	Lapis Perikat - Aspal Cair/Emulsi	- Liter
6.3.(4)	Lapisan Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
DIVISI 7	STRUKTUR	
7.1.(7a)	Beton struktur f'c 20	- M3
7.1.(8)	Beton Mutu Rendah f'c 15 Mpa	- M3
7.1.(10)	Beton struktur f'c 10	- M3
7.3.(1)	Baja Tulangan Pokok BTP 260	- Kg
DIVISI 9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	- M2
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	1.500,00 M2

B. BAHAN PEKERJAAN		
NO	BAHAN	JUMLAH
B.1	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
B.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
B.3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
B.4	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
B.5	Lapisan Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
B.6	Beton Mutu Rendah f'c 15 Mpa	- M3
B.7	Marka Jalan Termoplastik	- M2
B.8	Pengendalian Tanaman	1.500,00 M2
B.9	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	- M3
B.10	Timbunan Blase dari Sumber Galian	- M3
B.11	Geotekstil Separator Kelas 2	- M2
B.12	Beton struktur f'c 20	- M3
B.13	Beton struktur f'c 10	- M3
B.14	Baja Tulangan Pokok BTP 260	- Kg

C. PENGGUNAAN PERALATAN PEKERJAAN		
NO	PERALATAN UTAMA	JUMLAH
C.1	Asphalt Finisher	- Unit
C.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
C.3	Concrete Mixer 0.3 - 0.6 M3	- Unit
C.4	Dump Truck	- Unit
C.5	Excavator 60 - 140 M3	- Unit
C.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
C.7	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	- Unit
C.8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
C.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
C.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
C.11	Concrete Vibrator	- Unit
C.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
C.13	Asphalt Distributor	- Unit

D. PERSONIL KEGIATAN		
NO	PERSONIL	JUMLAH
D.1	Direksi	- Orang
D.2	Konsultan Superint	- Orang
D.3	Politeknika	- Orang
D.4	Mandor	- Orang
D.5	Pekerja	- Orang
D.6	Tukang	- Orang
D.7	Sopir	- Orang
D.8	Operator	- Orang
D.9	Pembantu Operator	- Orang
D.10	Mekanik	- Orang

E. KONDISI CUACA DI LOKASI PEKERJAAN			
NO	CUACA	PAGI	SORE
E.1	Cerah		
E.2	Mendung		
E.3	Gembris		
E.4	Hujan		
E.5	Langsa		
E.6	Banjir (Genangan Air)		

INSTANSI	CATATAN	TANDA TANGAN/PARAF
KONSULTAN PENGAWAS		
PENYEDIA JASA		

LAPORAN HARIAN

07 November 2024



Pekerjaan	Penanganan Long Segmen Jalan Marugal I (DAK- Non Tematik)
Nomor Kontrak	620/226/DPUPR-BM/VI/2024
Tanggal Kontrak	26 April 2024
Nilai Kontrak	Rp. 8.535.873.954,31
Nomor Adendum I	620/1185/DPUPR-BM/VI/2024
Tanggal Adendum I	01 Juli 2024
Nilai Adendum I	Rp. 8.535.873.954,31
Nomor Adendum II	620/2903/DPUPR-BM/VI/2024
Tanggal Adendum II	22 Oktober 2024
Nilai Adendum II	Rp. 8.535.873.954,31
Penyedia Jasa	PT. SIKUT IRENG PRATAMA
Konsultan Pengawas	CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
Tahun Anggaran	2024

A. ITEM PEKERJAAN		
NO	PEKERJAAN	VOL
DIVISI 1 UMUM		
1.2	MOBILISASI	
A	SEWA TANAH	- M2
B	PERALATAN	
B.1	Asphalt Finisher	- Unit
B.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
B.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
B.4	Dump Truck	- Unit
B.5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
B.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
B.7	Wheel Loader 1,0-1,5 M3	- Unit
B.8	Tandem Roller 5 - 8 T	- Unit
B.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
B.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
B.11	Concrete Vibrator	- Unit
B.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
B.13	Asphalt Distributor	- Unit
C	KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS	
C.1	Papan Nama Kegiatan	- Ls
D	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM	
D.2	Soil & Aggregate Testing	- Set
D.3	Blumhouse Testing	- Set
D.4	Concrete Testing	- Set
D.5	Test Luar	- Set
E	MOBILISASI PERSONIL	
E.1	Personil Geotek Struktur Organisasi	- Ls
E.2	Personil Lainnya	- Set
G	DEMOKRASI	1,00 Ls
1.8	BMK3	0,02 Ls
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	- M3
3.2.(1a)	Timbunan Biosa dari Sumber Galian	- M3
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	- M2
DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR		
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL		
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
6.1.(2a)	Lapis Penutup - Aspal Cair/Emulsi	- Liter
6.3.(4)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
DIVISI 7 STRUKTUR		
7.1.(7a)	Beton struktur f'c'20	- M3
7.1.(8)	Beton Mutu Rendah f'c'15 Mpa	- M3
7.1.(10)	Beton struktur f'c'10	- M3
7.3.(1)	Baja Tulangan Pokok BTP 280	- Kg
DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN		
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	- M2
DIVISI 10 PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		
10.1.(22)	Pengendalian Tanah	1.600,00 M2

B. BAHAN PEKERJAAN		
NO	BAHAN	JUMLAH
B.1	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
B.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
B.3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
B.4	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
B.5	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
B.6	Beton Mutu Rendah f'c'15 Mpa	- M3
B.7	Marka Jalan Termoplastik	- M2
B.8	Pengendalian Tanah	1.600,00 M2
B.9	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	- M3
B.10	Timbunan Biosa dari Sumber Galian	- M3
B.11	Geotekstil Separator Kelas 2	- M2
B.12	Beton struktur f'c'20	- M3
B.13	Beton struktur f'c'10	- M3
B.14	Baja Tulangan Pokok BTP 280	- Kg

C. PENGGUNAAN PERALATAN PEKERJAAN		
NO	PERALATAN UTAMA	JUMLAH
C.1	Asphalt Finisher	- Unit
C.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
C.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
C.4	Dump Truck	- Unit
C.5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
C.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
C.7	Wheel Loader 1,0-1,5 M3	- Unit
C.8	Tandem Roller 5 - 8 T	- Unit
C.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
C.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
C.11	Concrete Vibrator	- Unit
C.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
C.13	Asphalt Distributor	- Unit

D. PERSONIL KEGIATAN		
NO	PERSONIL	JUMLAH
D.1	Direksi	- Orang
D.2	Konsultan Supervisi	- Orang
D.3	Pelaksana	- Orang
D.4	Mandor	- Orang
D.5	Pekerja	- Orang
D.6	Tukang	- Orang
D.7	Sopir	- Orang
D.8	Operator	- Orang
D.9	Pembantu Operator	- Orang
D.10	Mekanik	- Orang

E. KONDISI CUACA DI LOKASI PEKERJAAN				
NO	CUACA	PAGI	SIANG	BORE
E.1	Cerah			
E.2	Mendung			
E.3	Gerimis			
E.4	Hujan			
E.5	Longsor			
E.6	Ranir (Gerangan Air)			

INSTANSI	CATATAN	TANDA TANGAN/PARAF
KONSULTAN PENGAWAS		
PENYEDIA JASA		
